

# Riihikosken Virastotalo VIIKKOTIEDOTE 49-50

Viikko

Tapahtuma

49

- Julkisivun tiilivuorauksen purku
- Betonisten kannatinpalkkien piikkaus

50

- Piikkaustyöt valmiita

Tulevat toimenpiteet

51

- Rankamateriaalit työmaalle
- Villojen purku
- Rankojen pystytys


Resurssit

Voivala Yhtiöt Oy

1 vastaava työnjohtaja 1 työnjohtaja

Turun Kenttärakentajat Oy

5 työntekijää

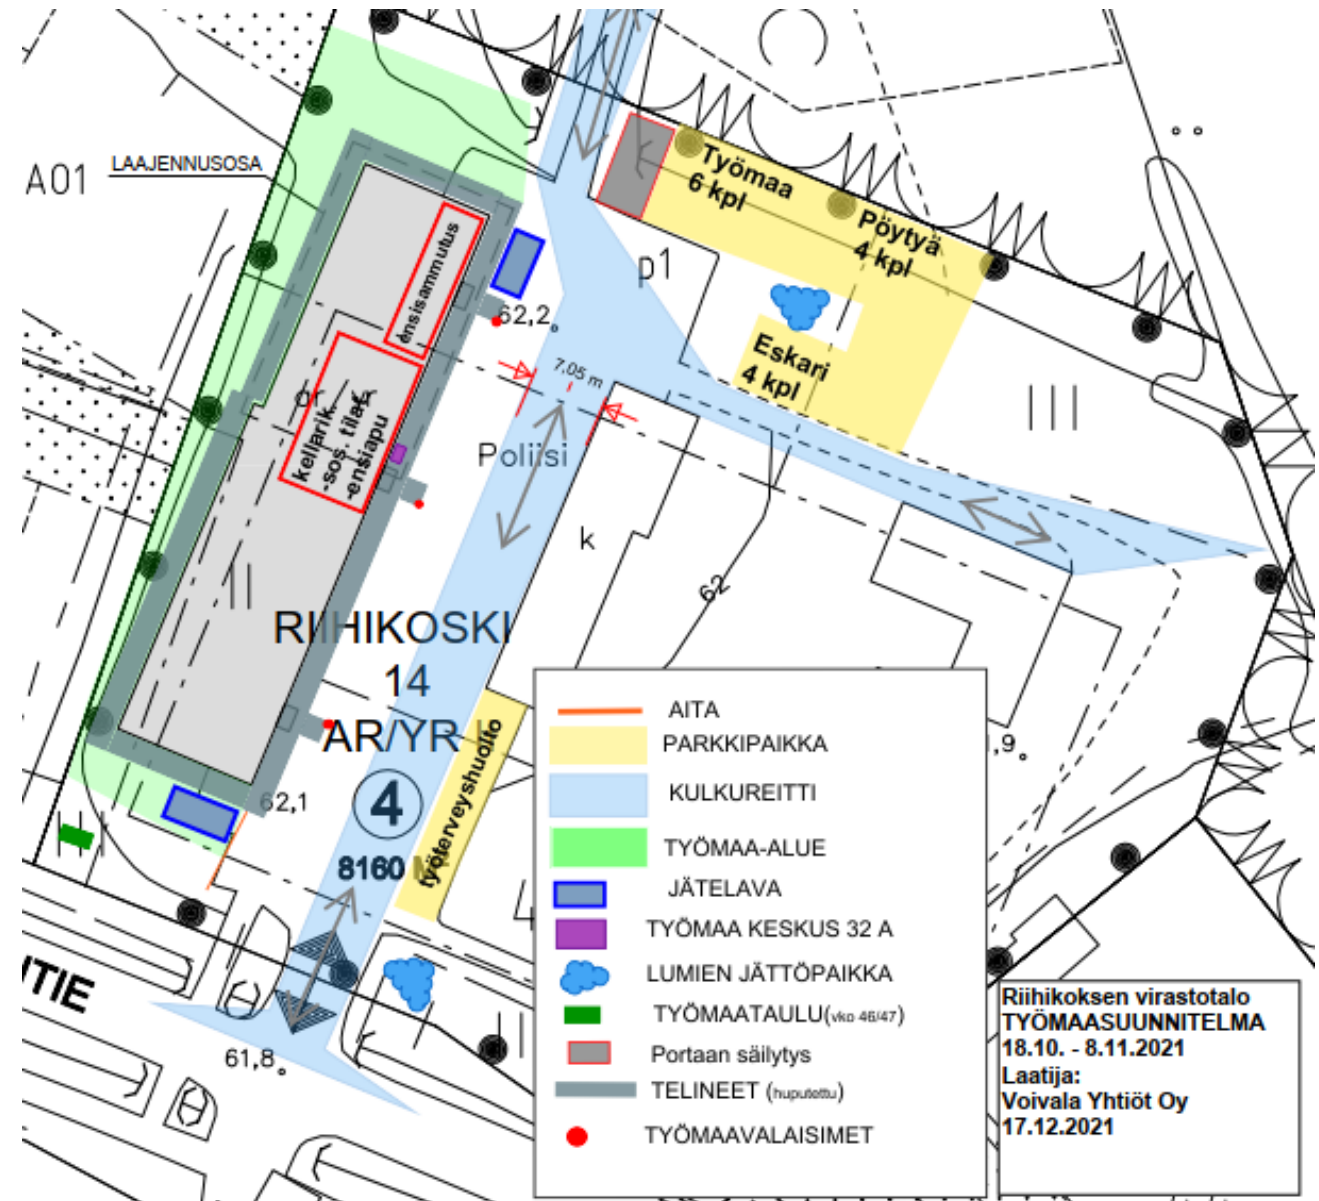

Työmaa käynnissä

**56** päivää

TAPATURMIA  
TYÖMAALLA

**0** kpl

RAKENNUS  
**VOIVALA**
