

Riihikosken Virastotalo

VIKKOTIEDOTE

51-1

Viikko

Tapahtuma

51

● Termorankojen toimitus työmaalle

52

● C-Termorankojen asennustyö sekä villoitus


1

● C-Termorankojen asennustyö sekä villoitus

*Tulevat
toimenpiteet*

2

● C-Termorankojen asennustyö sekä villoitus

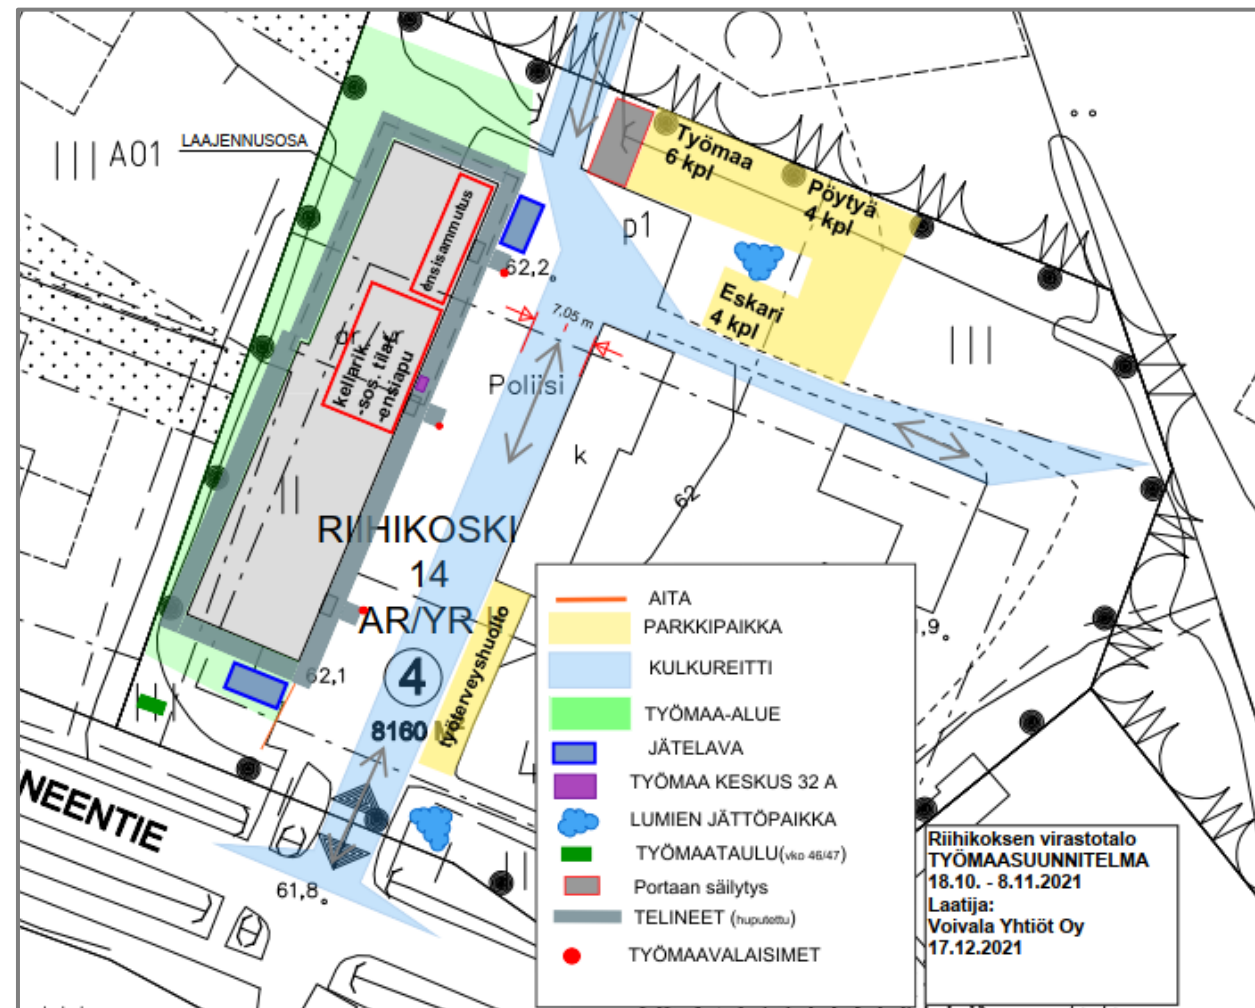

Resurssit

Voivala Yhtiöt Oy

1 vastaava työnjohtaja 1 työnjohtaja
2 työntekijää

Turun Kenttärakentajat Oy

1 työntekijä

Työmaa käynnissä **77** päivää

TAPATURMIA
TYÖMAALLA

0 kpl

RAKENNUS
VOIVALA
